

Федеральный проектный офис


**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы

21 февраля 2017 г.

Москва

Динамика исполнения контрольных точек

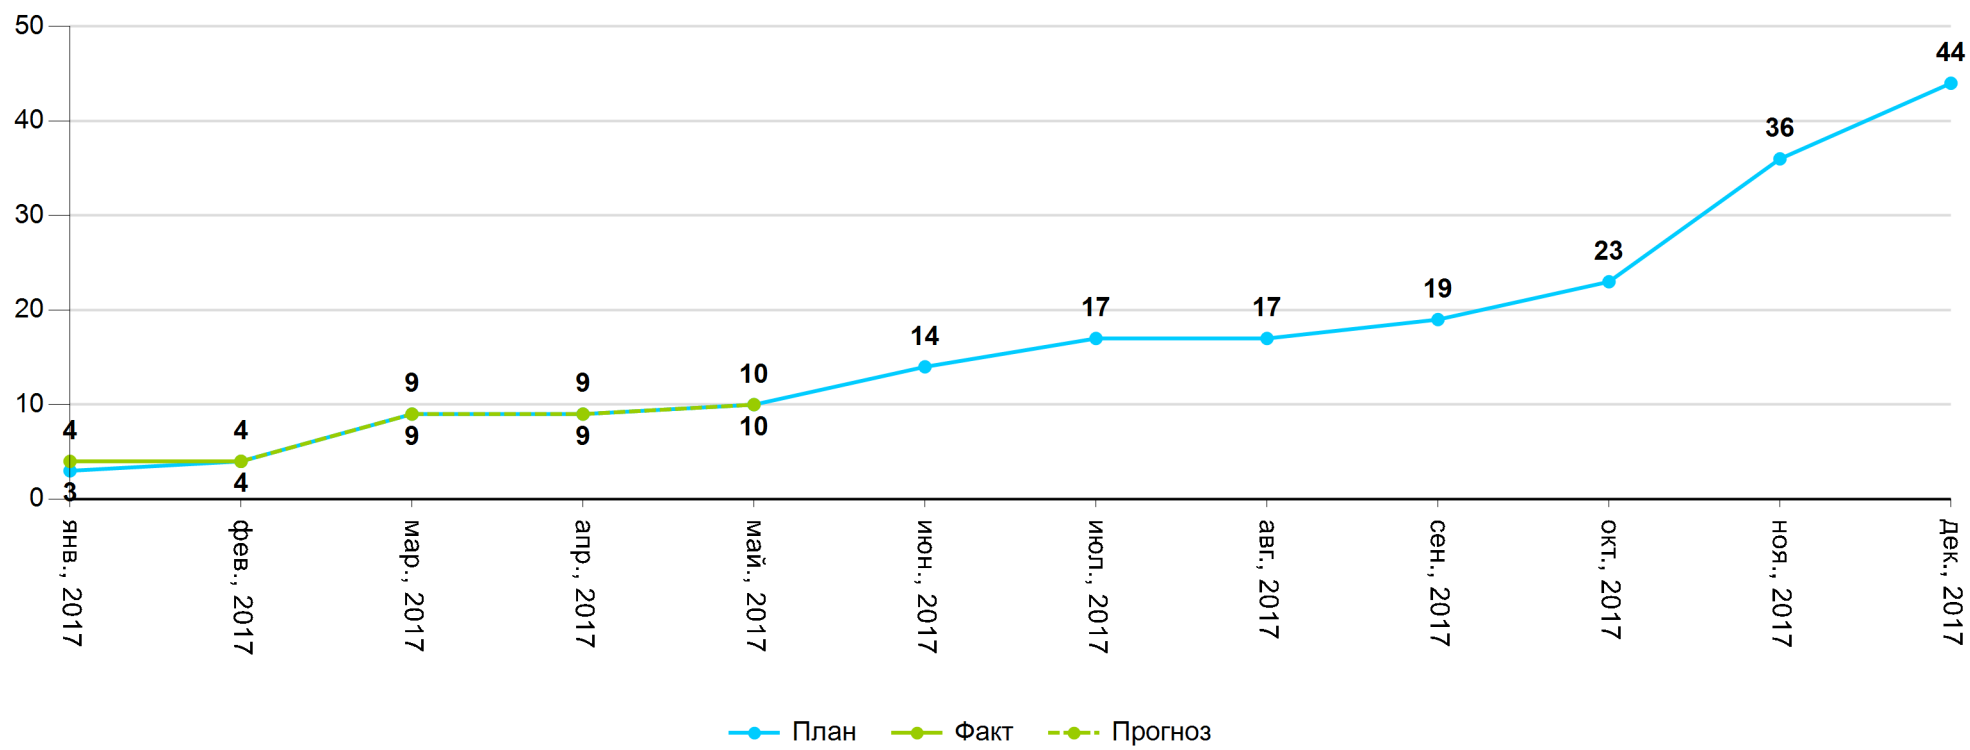

Статус исполнения контрольных точек по функциональным направлениям

№ п/п	Функциональное направление	Статус	Прогноз
1.	Организационные мероприятия (Браверман А.А.)	2	
2.	Развитие Бизнес-навигатора МСП и Портала Бизнес-навигатора МСП (Браверман А.А.)	1	
3.	Развитие женского предпринимательства (Браверман А.А.)		1
4.	Развитие сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации (Браверман А.А.)	1	1 1
5.	Развитие системы "одного окна" предоставления услуг, сервисов и мер поддержки субъектам ИМП на базе Центров оказания услуг (Браверман А.А.)		2
6.	Реализация кредитно-гарантийной поддержки ИМП в рамках НГС (Браверман А.А.)		1

Отсутствие информации
 Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений

Сведения об исполнении контрольных точек

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование КТ	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	факт/прогноз	
Организационные мероприятия							
1.	Президиум Совета	■	10000-00752. Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	Браверман А.А.	01.12.2016	21.11.2016	Выполнено. Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 №10)
2.	Президиум Совета	■	10000-00753. Утверждение сводного плана проекта	Браверман А.А.	20.12.2016	27.12.2016	Выполнено. Проект сводного плана подготовлен и направлен на рассмотрение проектного комитета письмом АО "Корпорация "МСП" от 14.12.2016 № АБ-19/11399 Перенос срока исполнения контрольной точки связан с утверждением даты заседания Проектного комитета, на котором планируется рассмотрение сводного плана, на 27.12.2016 Сводный план утвержден протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 27.12.2016 № 15

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование КТ	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	факт/ прогноз	
Развитие Бизнес-навигатора МСП и Портала Бизнес-навигатора МСП							
3.	Президиум Совета	■	10000-00767. Утверждены методические рекомендации для субъектов Российской Федерации и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, устанавливающие требования к сведениям и базам данных для загрузки в Бизнес-навигатор МСП	Браверман А.А.	31.01.2017	23.12.2016	Выполнено. Методические рекомендации утверждены протоколом заседания Совета директоров АО "Корпорация "МСП" от 23.12.2016 № 24

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование КТ	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	факт/прогноз	
Развитие женского предпринимательства							
4.	Президиум Совета	■	10000-00817. Разработан специальный финансовый продукт АО "Корпорация "МСП" с участием АО "МСП Банк", а также банков-партнеров АО "Корпорация "МСП", для женщин-предпринимателей, в том числе прошедших обучение по программам АО "Корпорация "МСП"	Браверман А.А.	31.03.2017	31.03.2017	<p>В работе. АО «МСП Банк» разработал и представил в АО «Корпорация МСП» кредитный продукт для женщин – предпринимателей. В настоящее время продукт проходит обсуждение в рамках рабочей группы в АО «Корпорация МСП» и АО "МСП Банк". Планируемая дата утверждения продукта на заседании Правления АО "МСП Банк" - 28.02.2017 года.</p> <p>АО «Корпорация МСП» разработаны изменения в Регламент отбора финансовых организаций-партнеров АО "Корпорация "МСП" в части оказания гарантийной поддержки субъектам МСП. Планируется утвердить изменения на заседании Совета директоров АО "Корпорация "МСП" в 1 квартале 2017 года.</p> <p>Отсутствуют риски, не позволяющие реализовать контрольную точку в полном объеме в установленные сроки.</p>

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование КТ	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	факт/прогноз	
Развитие сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации							
5.	Президиум Совета	■	10000-00770. Утверждены рекомендации по разработке государственных программ (подпрограмм) развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации	Браверман А.А.	01.03.2017	02.03.2017	В работе. Первое заседание рабочей группы для целей выработки политики развития сельскохозяйственной кооперации проведено 14.02.2014 (протокол № 1 от 14.02.2014). На заседании рассмотрен и одобрен с учетом состоявшегося обсуждения проект рекомендаций по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации. Материалы для рассмотрения на заседании проектного комитета направлены в Правительство Российской Федерации письмом от 16.02.2017 № АБ-19/2336. Перенос срока исполнения контрольной точки связан с утверждением даты заседания проектного комитета, на котором планируется рассмотрение вышеуказанных рекомендаций, на 02.03.2017
6.	Президиум Совета	■	10000-00771. Сформирована Рабочая группа из числа отобранных субъектов Российской Федерации для целей выработки политики развития сельскохозяйственной кооперации	Браверман А.А.	01.02.2017	31.01.2017	Выполнено. Утвержден приказ АО «Корпорация «МСП» от 31.01.2017 №15 "О создании рабочей группы для целей выработки политики развития сельскохозяйственной кооперации"

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование КТ	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	факт/ прогноз	
7.	Президиум Совета	■	10000-00772. Отобраны 5 субъектов Российской Федерации для разработки и утверждения государственных программ (подпрограмм) развития сельскохозяйственной кооперации в рамках первой очереди	Браверман А.А.	31.03.2017	31.03.2017	<p>В работе.</p> <p>Получены предложения от отдельных субъектов РФ по участию в приоритетном проекте в части развития сельскохозяйственной кооперации в рамках первой очереди.</p> <p>Получены предложения Минсельхоза России по вопросу отбора субъектов РФ для участия в приоритетном проекте в части развития сельскохозяйственной кооперации в рамках первой очереди. В плане работы рабочей группы для целей выработки политики развития сельскохозяйственной кооперации и в протоколе № 1 от 14.02.2017 определен срок подготовки субъектами РФ, планируемыми для реализации приоритетного проекта в 2017 г. (первая очередь), плана мероприятий по разработке и утверждению программ развития сельскохозяйственной кооперации. Материалы для отбора субъектов РФ будут направлены в Правительство РФ в соответствии с планом работы проектного комитета. Отсутствуют риски, не позволяющие реализовать контрольную точку в полном объеме в установленные сроки.</p>

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование КТ	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	факт/прогноз	
Развитие системы "одного окна" предоставления услуг, сервисов и мер поддержки субъектам ИМП на базе Центров оказания услуг							
8.	Президиум Совета	■	10000-00777. Утверждены модель организации и функционирования Центров оказания услуг (включающая примерный перечень услуг, сервисов, мер поддержки) и план действий ("дорожная карта") по организации Центров оказания услуг в субъектах Российской Федерации	Орешкин М.С.	31.03.2017	31.03.2017	В работе. Разработаны проект модели организации и функционирования Центров оказания услуг (включающей примерный перечень услуг, сервисов, мер поддержки) и плана действий («дорожной карты») по организации Центров оказания услуг в субъектах Российской Федерации для внесения на рассмотрение на заседании Президиума Совета. Отсутствуют риски, не позволяющие реализовать контрольную точку в полном объеме в установленные сроки.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование КТ	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	факт/ прогноз	
9.	Президиум Совета	■	10000-00778. Утверждены перечень услуг, оказываемых в Центрах оказания услуг, и стандарты их предоставления, а также определены механизмы взаимодействия указанных Центров с органами государственной власти и местного самоуправления и иными поставщиками услуг	Орешкин М.С.	15.05.2017	15.05.2017	В работе. Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении субсидии из федерального бюджета российским коммерческим организациям на обеспечение создания системы «одного окна» для оказания услуг, а также предоставления образовательной поддержки малым предприятиям в субъектах Российской Федерации» (далее - проект постановления). Проект постановления направлен на согласование в Минфин России. На регулярной основе (еженедельно) проводятся консультации с представителями банковского сообщества и экспертами в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Отсутствуют риски, не позволяющие реализовать контрольную точку в полном объеме в установленные сроки.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование КТ	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	факт/прогноз	
Реализация кредитно-гарантийной поддержки ИМП в рамках НГС							
10.	Президиум Совета	■	10000-00788. Утверждены основные положения новой системы управления рисками в отношении подходов к оценке рисков при рассмотрении и выдаче гарантий и поручительств субъектам МСП участниками НГС при сохранении баланса между увеличением охвата получателей кредитно-гарантийной поддержки и минимизацией кредитных рисков	Браверман А.А.	31.03.2017	31.03.2017	В работе. Основные положения новой системы управления рисками отражены в Единых требованиях к системе управления рисками Национальной гарантийной системы, которые рассмотрены на заседании Совета директоров АО "Корпорация "МСП" от 23.12.2016 года № 24. В течение первого квартала 2017 года будут внесены дополнения во внутренние документы Корпорации в целях отражения инструментов оценки и управления риска, связанного с более высоким риск-аппетитом в части предоставления гарантийной поддержки субъектам индивидуального малого предпринимательства, реализующим новые инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. Отсутствуют риски, не позволяющие реализовать контрольную точку в полном объеме в установленные сроки.

■ Отсутствие информации

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений
